



福岡都市圏南部工場建設工事 工事だより Vol. 11 (H27.11)



福岡都市圏南部環境事業組合

建設工事工程		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
区分		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
準備工事		←→				
土工事			←→			
コンクリート工事			←→	←→	←→	
鉄骨躯体工事			←→	←→	←→	
仕上工事				←→	←→	
煙突工事			←→	←→		
管理棟他工事					←→	
外構工事				←→	←→	
プラント工事				←→	←→	
プラント試運転						←→

全体写真(H27.11月)



現在の工事状況

建築本体工事：建物は完成しました。外構工事、管理棟などの付属棟の工事を行っています。

煙突工事：平成26年12月上旬に工事が完了しました。

プラント工事：試運転・調整を行っています。

今後の工程

建築本体工事：外構・植栽など施設全体の整備を行います。平成28年1月末に完了予定です。

プラント工事：引き続き、試運転・調整を行います。

トピックス

- ・11月1日に組合事務所が管理棟2階に移転しました。
- ・12月1日よりごみ受入を開始します。

プラント工事 (プラットフォーム)




プラント工事 (炉室 排ガス処理室)



本体工事 (計量棟)



福岡都市圏南部工場 配置図

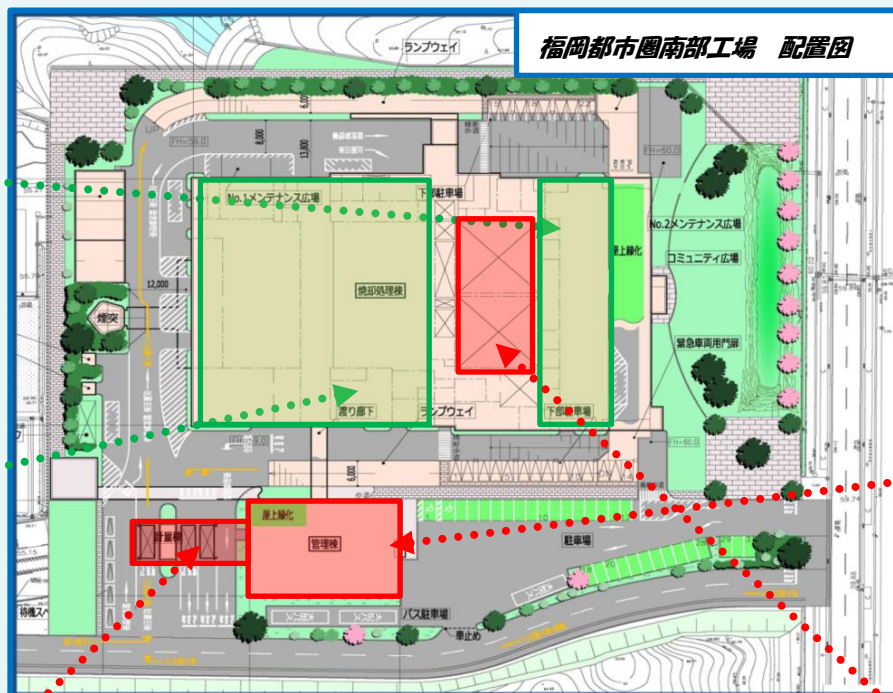

本体工事 (工場棟)



本体工事 (管理棟)



本体工事 (ごみピット)

