



(仮称) 新南部工場建設工事 工事だより Vol. 4 (H26.2)



福岡都市圏南部環境事業組合

建設工事工程		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
区分						
準備工事		←				
土工			←			
コンクリート工事			←	→		
鉄骨躯体工事			←	→		
仕上工事					←	→
煙突工事			←	→		
管理棟他工事					←	→
外構工事					←	→
プラント工事				←	→	
プラント試運転						←

現南部工場煙突より(H26.1月末)



現在の工事状況

建築本体工事：ごみピット地上部 排ガス処理室・発電機室2階 炉室

地下部分の鉄筋・鉄骨・コンクリート工事を行っています。

煙突工事：地上部外筒の鉄筋・コンクリート工事を行っています。

今後の工程

ごみピット、灰ピット地上部・炉室地下部

：鉄筋・コンクリート工事

排ガス処理室・発電機室：鉄筋・鉄骨・コンクリート工事

煙突（外筒）：鉄筋・コンクリート工事

煙突工事

GL + 約25m


まで躯体が完成しました。



本体工事

(排ガス処理室・発電機室)

2F床レベルまで完成し、上階の鉄骨建方等を行っています。

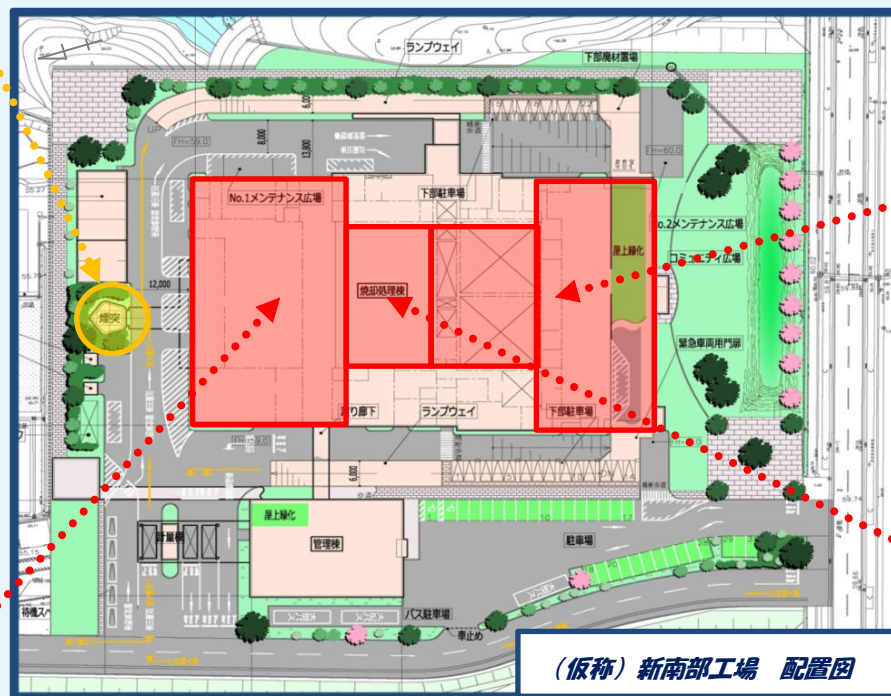

(仮称) 新南部工場 配置図

本体工事 (ごみピット・スラットフォーム)

ピット地下部分のコンクリート打設が完了し、埋戻しを行っています。

スラットフォーム基礎下の地盤改良を行っています。



本体工事 (炉室)

耐圧盤の配筋を施工し、本体が一体になりました。

